


CPER - IGLEX

H. Monard, S. Della Negra

- Réhabilitation Igloo pour ThomX et Andromède : **2,1 M€** : terminé
11 lots, 15 entreprises,
non réalisés, reste à faire : tests en charge **11 k€**, faux plancher ThomX **30 k€** : **2018**
pris sur projet : chemin câbles, contrôle accès
- Marché PSS+radioprotection : 216+246 = **462 k€** (2015) ~500 k€ : **2018**
- Projet Fresque : ravalement façade igloo + peinture : **500k€?** : **2018 ?**
projet fresque abouti (Beton Puzzle) entreprise ?
- Étanchéité corridor : **? k€** : **2018 ?** (*seconde option mur interne ou injection ~10 k€*)
à faire d'urgence : infiltration eau dans corridor : ne pas grouper avec PRAE
- Intégration Andromède : 80 k€ (NEC) + 5 k€ (BOVIS) (prix 2016) : **2018**
 - **PRAE : impact sur ThomX : co-activité ?**Décaissement pour PRAE : **? k€** : 2019 ? (financement Etat)

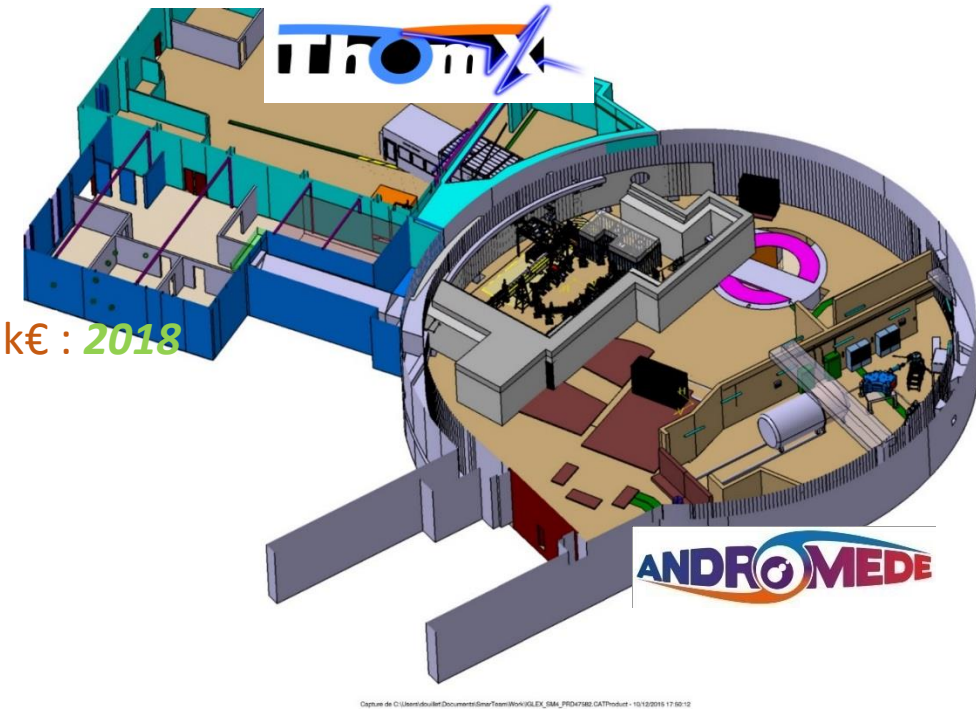

Questions sur D3 – D4 :

- Labo Vide & Surface
- bureaux+ salle réunion
- Salles montages/tests?
THomX, Andromède, PRAE

SD4 ~320 m² SD3~100m² SD2~230m²

