

## Revue Synthétique de Projet IN2P3 T2K upgrade - LPNHE

[Boris.Popov@lpnhe.in2p3.fr](mailto:Boris.Popov@lpnhe.in2p3.fr)  
[parraud@lpnhe.in2p3.fr](mailto:parraud@lpnhe.in2p3.fr)

# Revue Synthétique de Projet IN2P3

## Plan présentation

- PRESENTATION GLOBALE
- PLAN DE MANAGEMENT
- PLAN DE DEVELOPPEMENT
- ANALYSE DE RISQUES
- DEMANDES DE SOUTIEN à L'IN2P3
- CONCLUSIONS

# Revue Synthétique de Projet IN2P3

## Présentation Globale du Projet

### ◆ **Présentation globale**

- Présentation scientifique synthétique
- Objectifs initiaux et évolution
- Organigramme global du projet
- Responsabilités prises par l'IN2P3 au sein de la collaboration totale.

**Remarque: Cette présentation globale sera faite sur un laps de temps maximal de 20 minutes.**

# Revue Synthétique de Projet IN2P3

## Plan de Management du Projet

### ◆ Organigramme du projet IN2P3

– Répondre aux questions suivantes:

- Qui est responsable de quoi exactement au niveau de l'organisation du projet?
- Périmètre de prise de responsabilités et interfaces entre les laboratoires français et étrangers.
- L'organigramme global du projet devra faire apparaître en couleur différente les lots attribués à un ou plusieurs laboratoires de l'IN2P3

Supply AFTER chips

Front-End Card design, production, test

Front-End Mezz. design, production, test

Front-End Mezz. firmware

Front-end card Prod. test-bench

Front-end mezz. Prod. test-bench

*on-detector*  
*off-detector*

Back-end Board design, production, test

Embedded Firmware & Software

DAQ hardware & software

Power supplies Cabling, ...

Mechanics, Cooling

Detector test & calib. Test-bench

*To be confirmed*

*Services and specific functions*

Irfu – CEA Saclay

Lpnhe


Warsaw


IFAE

Shared and others


## Collaborative view

- If contribution confirmed, all tasks related to electronic hardware, firmware and software assigned
- Still unclear about mechanics and cooling

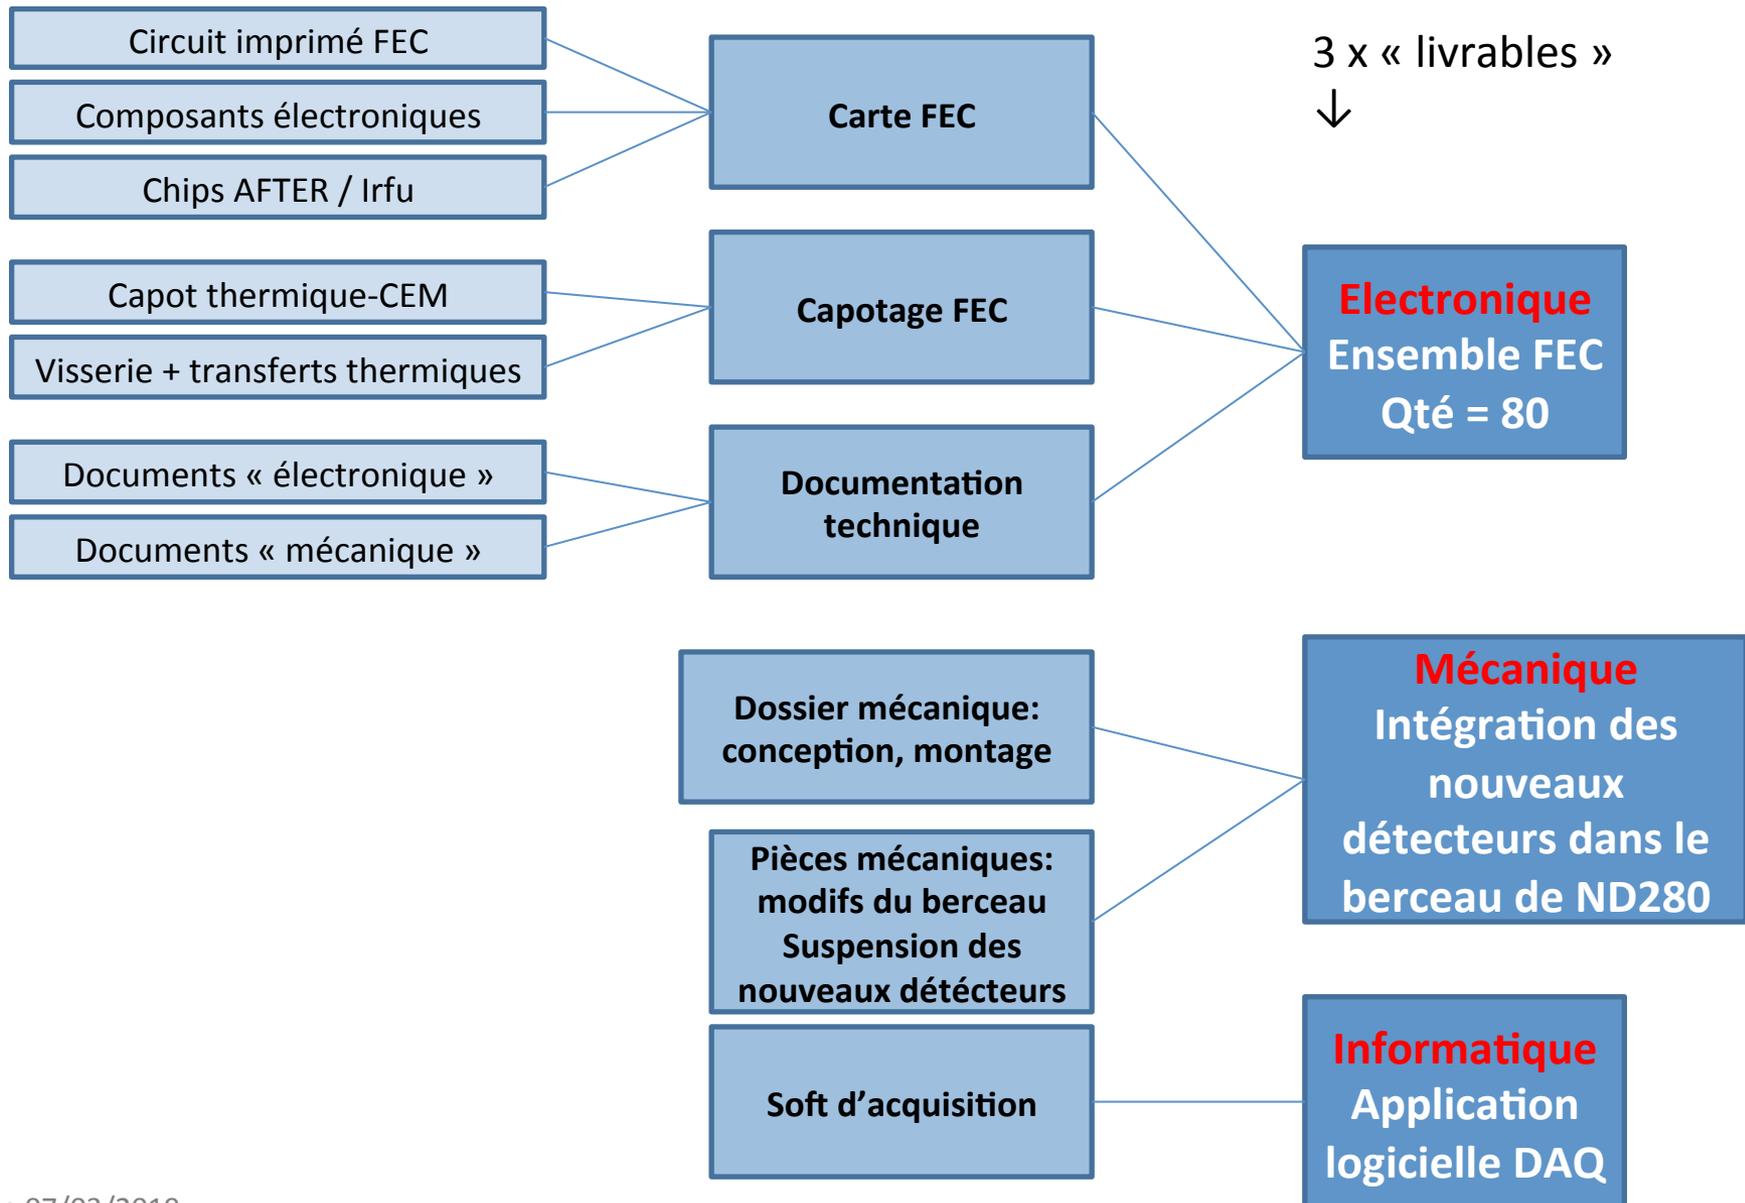


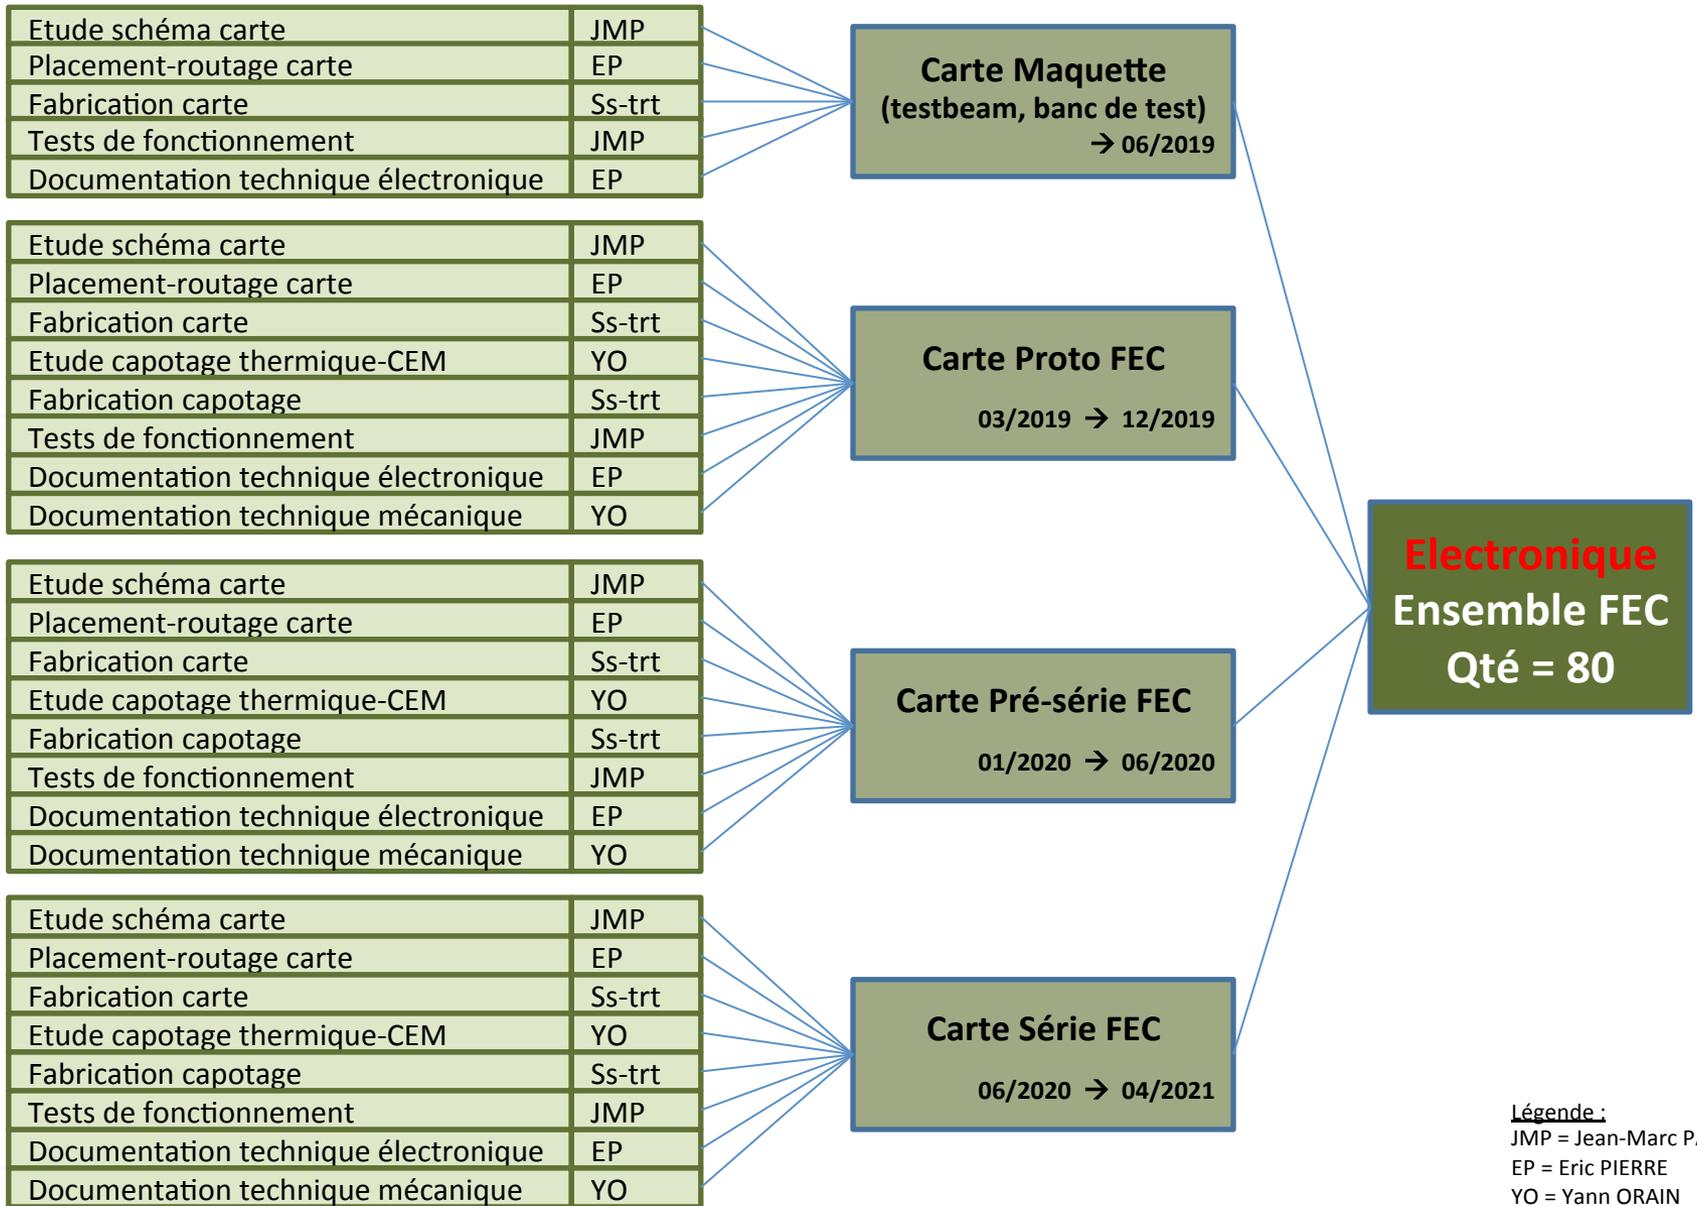

Légende :  
 JMP = Jean-Marc PARRAUD  
 EP = Eric PIERRE  
 YO = Yann ORAIN  
 Ss-trt = sous-traitant

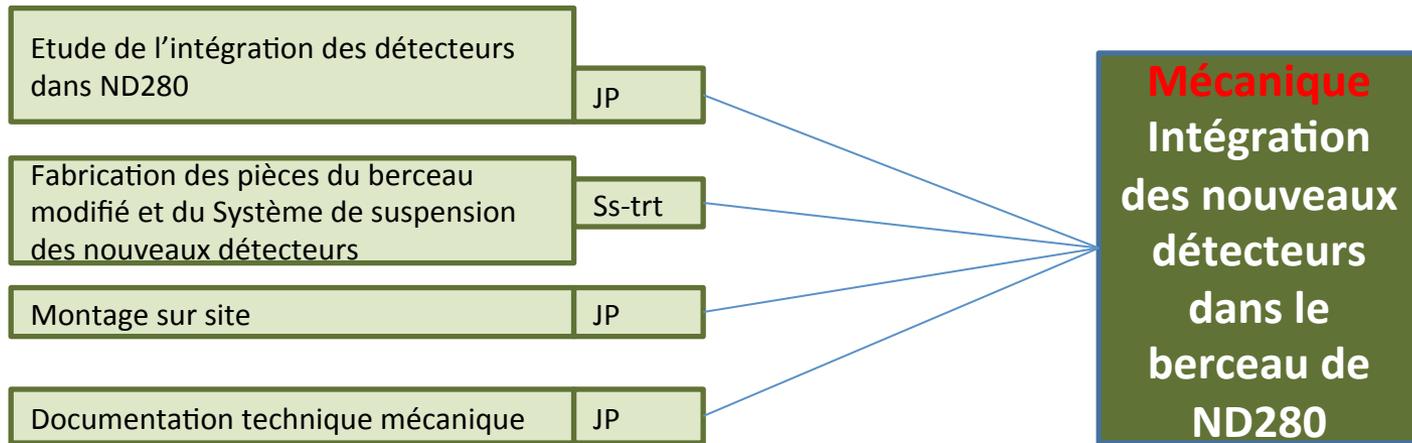

Légende :  
JP = Julien PHILIPPE  
Ss-trt = sous-traitant



Légende :  
DT = Diego TERRONT

### ◆ Ressources Humaines

- Répondre aux questions suivantes:
  - Evolution des ressources humaines sur les 2 années précédentes, l'année en cours et les 2 prochaines années en séparant les chercheurs et ITA

	2018	2019	2020	2021	2022
Physiciens	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
IT	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0

### ◆ Ressources Financières

– Répondre aux questions suivantes:

- Evolution des ressources financières (Recettes/Dépenses) sur les 2 années précédentes, l'année en cours et les 2 prochaines années.

	2018	2019	2020	2021	2022
IN2P3	0	60k	60k	60k	20k

### ◆ Instrument ou Technologie développée

– Répondre aux questions suivantes :

- Production par le LPNHE de 80 cartes FEC pour les nouvelles TPC
- Reproduction avec évolution d'une carte FEC existante (576 voies contre 288 précédemment).
- Principales performances attendues: intégration de 576 voies de mesures par carte supportant 8 ASICs AFTER de traitement, numérisées via un convertisseur analogique-numérique cadencé à 40 MHz afin de transmettre les données vers les cartes FEM/Irfu. Un circuit de calibration est prévu pour garantir la précision des mesures ( $< \pm 2\%$ )
- Avantages: utilisation du chip AFTER déjà existant.
- Quels sont les principaux verrous technologiques à surmonter ?: aucun mais risques liés au nouveau choix de connecteurs (à valider, côté Micromegas et côté FEM)
- Une première maquette de carte FEC a été fabriquée et est en test (mécanique et électrique) à l'Irfu (février 2019)

### ◆ Instrument ou Technologie développée

– Répondre aux questions suivantes:

- Principaux jalons prévus sur le projet pour atteindre les objectifs demandés ?
- Fin 2018 : Première maquette
- Fin mars 2019: Deuxième maquette
- Fin 2019: Prototype de FEC pour équiper un démonstrateur de module-détecteur
- Été 2020: Pré-série
- Fin 2020: Production
- 2021: tests au CERN
- Fin 2021: Intégration à J-PARC (détecteurs, électronique et DAQ)
- 2022: commissioning

# Revue Synthétique de Projet IN2P3

## Analyse de Risques du Projet

Types de risques	Risques (= événements redoutés) identifiés	Probabilité P (1 à 4)	Gravité G (1 à 4)	Criticité (PxG)	Actions envisagées pour réduire les risques les + critiques, scenarii de repli
Externes au projet (contexte, environnement)	Sismique Budget de J-PARC (et incidence sur l'upgrade général de l'accélérateur)				
Scientifiques & techniques	Utilisation de Micromegas résistifs (première) Choix des connecteurs crucial pour la durée de vie de l'expérience Intégration des nouveaux détecteurs dans un espace très limité (accès difficile pour maintenance et réparation)				R&D et prototypages en cours (mars 2019)
Liés aux sous- traitants					
Humains & organisationnels					

# Revue Synthétique de Projet IN2P3

## Demandes auprès de l'IN2P3

### ◆ **Demande de soutien de l'IN2P3 pour le projet**

– Répondre aux questions suivantes:

- Quels sont les demandes de soutien en Ressources Humaines, financiers, locaux et matériels prévus d'être demandés à l'IN2P3 pour le projet sur l'année en cours et les deux prochaines années?
- **Demandes financières (voir ci-dessus)**
- **Demandes en RH obtenues auprès du LPNHE**
- **Espace: zone de test et de stockage en cours de négociations au LPNHE**

### ◆ Principales Conclusions

#### ◆ Plan Management

- ◆ Principales conclusions concernant le management du projet

#### ◆ Plan de Développement

- ◆ Principales conclusions concernant le plan de développement

#### ◆ Analyse de Risques

- ◆ Principales conclusions concernant l'analyse de risques

#### ◆ Demandes de soutien IN2P3

- ◆ Principales conclusions concernant les demandes IN2P3

#### ◆ Conclusions autres

- ◆ Conclusions autres que l'équipe projet voudra porter à l'attention des membres de revue.
