N°	Mode Tâche	Nom de la tâche
1		**Qualify integration site**
8		cahier des charges flat
9		cahier des charges incliné
10		MOPS
11		connecteurs (commande)
12		**Slice Demonstrator**
13		**Pigtail flat fast RD53A**
14		design pigtail flat
15		simulation SI
16		market survey, devis,...
17		fabrication pigtail flat
18		outillage cablage
19		cablage pigtail flat
20		tests à plat
21		pliage
22		tests pliés
23		**Pigtail incliné top**
24		design pigtail inclined
25		simulation SI
26		fabrication pigtail inclined
27		outillage cablage
28		cablage pigtail inclined
29		tests à plat
30		tests pliés
31		**Pigtail incliné bottom**
32		design pigtail inclined
33		simulation SI
34		fabrication pigtail inclined
35		outillage cablage
36		cablage pigtail inclined
37		tests à plat
38		tests pliés
39		**Pigtail flat baseline ITkPix**
40		design pigtail
41		simulation SI
42		market survey, devis,...
43		fabrication pigtail flat
44		outillage cablage
45		cablage pigtail flat
46		tests à plat
47		pliage
48		tests pliés
49		**PP0 flat 6M**
50		design PP0 flat 6M
51		fabrication PP0 6M
52		cablage PP0 6M
53		tests à plat
54		pliage
55		tests pliés
56		**PP0 flat 12M**
57		design PP0 flat 12M
58		fabrication PP0 12M
59		cablage PP0 12M
60		tests à plat
61		tests pliés
62		**Cartes de test**
63		carte test SI module+FPGA
64		carte test SI wing
65		fabrication
66		carte test SI Firefly
67		fabrication
68		design support 3D
69		fab. support 3D
70		**Outillage pliage pigtail**
71		design
72		fabrication
73		**Outillage pliage PP0**
74		design
75		fabrication
76		**Mechanical demonstrator**
77		Carbon End of longeron
78		Aluminum Longeron
79		SS pipes
80		Aluminum cells with cooling blocks
81		Qualify cell integtration tools/prcedure
82		**Preproduction**
83		Module preproduction
84		FDR services
85		Type 0 preproduction
86		FDR Loaded local supports
87		Local supports pre-production
88		Integration
89		**Production**
90		Services PRR
91		Services production
92		Local supports PRR
93		Local supports production
94		Integration

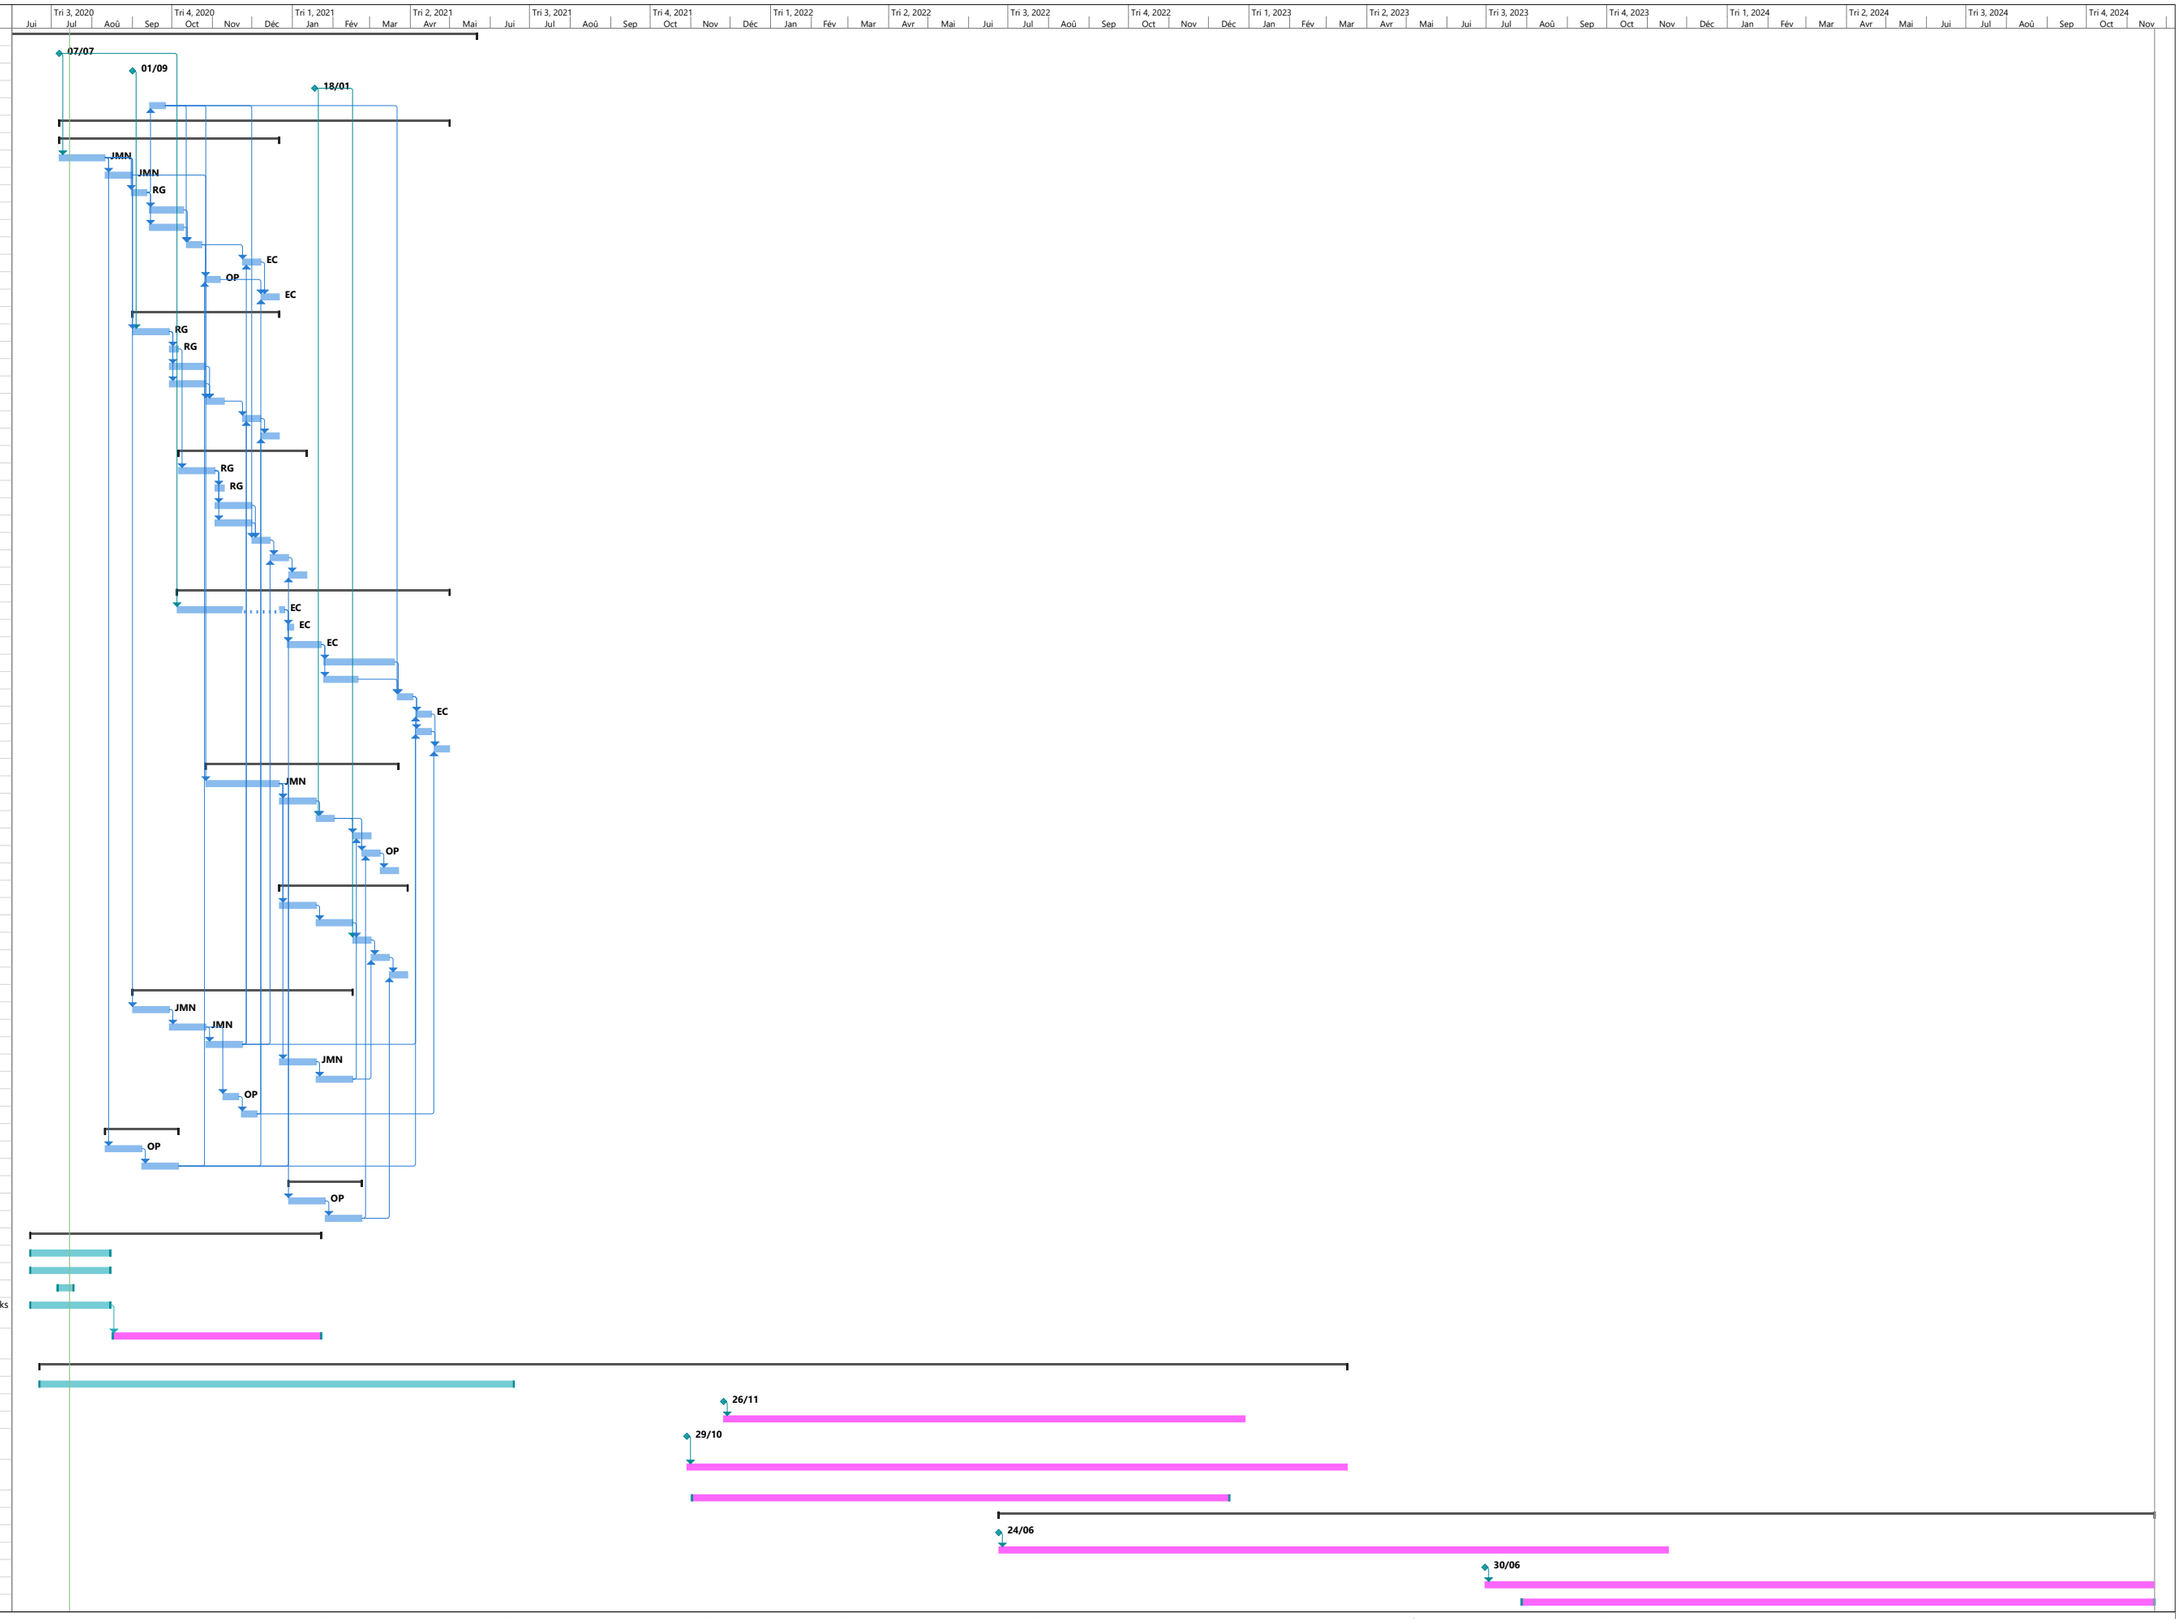

Projet : ATLAS_ITK_LAPP2.mpp
Date : Mer 15/07/20 13:25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
